ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : „Zdounky - lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská“

Objednatel:	Zhotovitel:	Vypracoval:	Schválil:
Obec Zdounky	ČAK CZ, s.r.o.	Ing. Tomáš Navrátil	Ing. Zdeněk Čevela, jednatel
Zdounky 27 768 02 Zdounky	Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž	**Datum:**	**Datum:**
IČ: 00287938	IČ: 25515608	05.08.2021	05.08.2021

Ozn. Položky	Popis položky	Doba trvaní ve dnech	Zahájení prací	Ukončení prací
Zdounky - lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská		**346**	**20.09.2021**	**31.08.2022**
1	Předání staveniště	1	20.09.2021	20.09.2021
2	Zařízení staveniště, vytyčení stavby, sítí, příprava	1	20.09.2021	20.09.2021
3	SO 01 Příprava území	18	20.09.2021	07.10.2021
4	SO 02.1 Asfaltová komunikace	329	01.10.2021	25.08.2022
5	SO 02.2 Komunikace pro pěší	86	01.06.2022	25.08.2022
6	SO 04 Veřejné osvětlení	61	01.05.2022	30.06.2022
7	SO 05 STL plynovod	76	01.03.2022	15.05.2022
8	SO 06 Pitný vodovod	76	01.03.2022	15.05.2022
9	SO 07 Jednotná kanalizace	68	01.10.2021	07.12.2021
10	SO 08 Dešťová kanalizace	120	01.12.2021	30.03.2022
11	SO 09 Terénní a sadové úpravy	32	25.07.2022	25.08.2022
12	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	345	20.09.2021	30.08.2022
13	Úklid stavby, finální úpravy	11	20.08.2022	30.08.2022
14	Předání provedeného díla	1	31.08.2022	31.08.2022

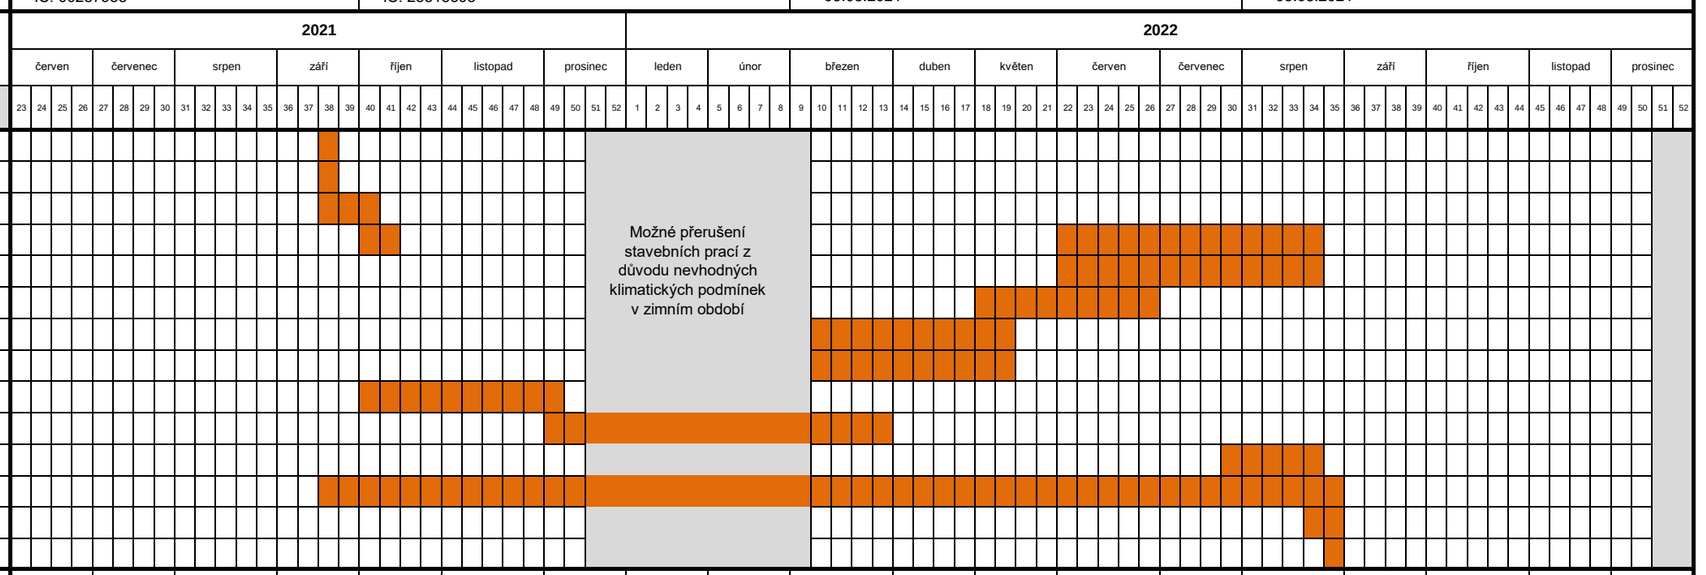

Měsíc	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Měsíční finanční plán v Kč bez DPH				850 000	2 600 000	2 600 000	1 500 000	300 000	800 000	1 800 000	2 800 000	3 500 000	3 800 000	3 800 000	2 944 813				
Měsíční finanční plán v Kč vč. DPH 21%				1 028 500	3 146 000	3 146 000	1 815 000	363 000	968 000	2 178 000	3 388 000	4 235 000	4 598 000	4 598 000	3 563 224				
Roční finanční plán v Kč bez DPH	7 550 000,00							19 744 813,30											
Celková cena stavby v Kč bez DPH	**27 294 813,30**																		
Celková cena stavby v Kč vč. DPH 21 %	**33 026 724,09**																		
